| Nº | Nom de la tâche |
|---|---|
| 1 | **Réception de commande** |
| 2 | Préparation dossier de lancement |
| 3 | Approvionnement matière |
| 4 | Réalisation du gabarit |
| 5 | **Réalisation 1ère antenne** |
| 6 | Débit et assemblage des secteurs |
| 7 | Montage à blanc des secteurs |
| 8 | Réalisation de la structure |
| 9 | Montage à blanc de la structure |
| 10 | Mise en peinture de la structure |
| 11 | Conditionnement |
| 12 | **Réalisation des 3 autres paraboles** |
| 13 | Débit et assemblage des secteurs |
| 14 | Montage à blanc des secteurs |
| 15 | Réalisation des structures |
| 16 | Montage à blanc des structures |
| 17 | Mise en peinture des structures |
| 18 | Conditionnement |

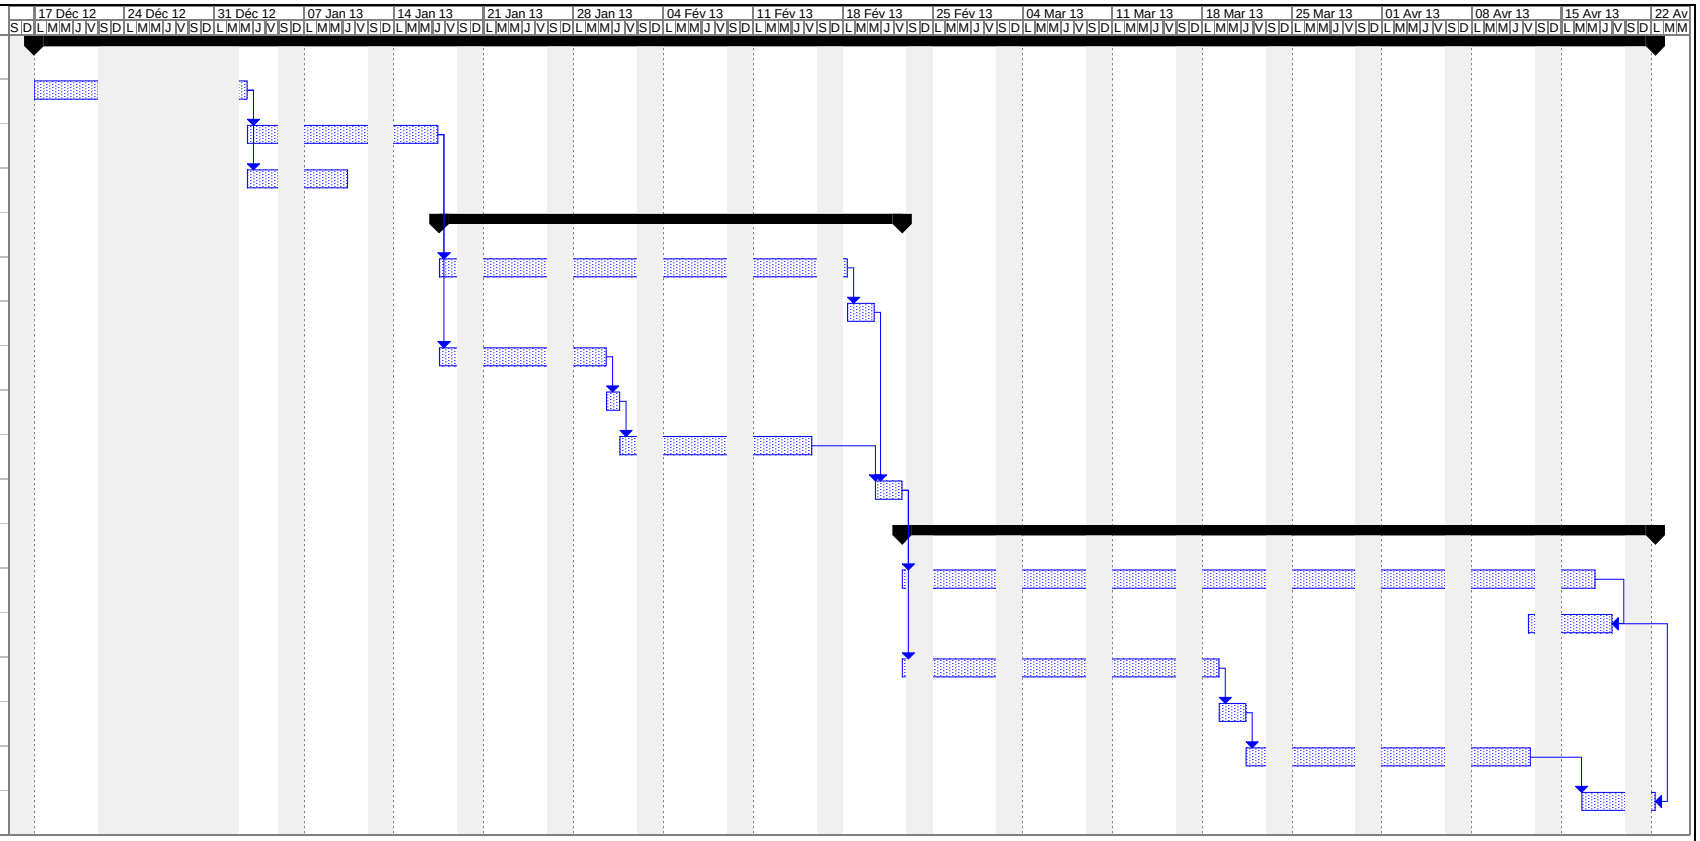


Projet : Planning N°35226
Date : Jeu 29/11/12

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tâche | | Avancement | | Récapitulative | | Tâches externes | | Échéance | |
| Fractionnement | | Jalon | | Récapitulative de projet | | Jalons externes | | | |
